Accordo quadro di 3 anni per la riqualificazione e ammodernamento di aule e spazi didattici comprensivo di fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e apparati audio-video del Policlinico di Bari.

AGGIORNAMENTO **27/05/2024**

DATA AVVIO APPALTO 07/12/2023

Ordini	Codice	AULE	N	Posti	Giorni	Arredi (importi)	Attrezz. (importi)	Lavori (importi)	TOT. (importi)
						650,00 €	40.000,00 €	1.000,00 €	
A		CLINICHE ODONTOIATRICHE	3	198	118,8				**269.064,81 €**
	21_1	*Aula A*		62	37,2				
	21_2	*Aula B*		86	51,6				
	21_3	*Aula C*		50	30				
B		CHIRURGIA	1	240	144	156.000,00 €	128.830,00 €	500.000,00 €	**784.830,00 €**
	20	*Aula De Blasi*		240	144	105.000,00 €		62.391,80 €	
C		RADIOLOGIA	2	125	75	59.648,00 €	48.202,00 €	101.487,00 €	**209.337,00 €**
	15_4	*Aula Radiologia*		100	60				
	15_4	*Aula*		25	15				
D		CLINICHE MEDICHE	2	400	240	380.000,00 €	217.000,00 €	642.000,00 €	**1.239.000,00 €**
	12_1	*Aula inferiore*		200	120				
	12_2	*Aula superiore*		200	120				
E		PEDIATRIA	2	130	78	114.500,00 €	40.000,00 €	215.000,00 €	**369.500,00 €**
	7_1	*Aula Vecchio*		100	60			8.944,00 €	
	7_2	*Aula B*		30	18				
F		ISTITUTI BIOLOGICI	4	735	441	477.750,00 €	80.000,00 €	1.562.500,00 €	**2.120.250,00 €**
	31_1	*Aula Mitolo*		165	99				
	31_2	*Aula Sangiorgi*		200	120				
	31_3	*Aula Solarino*		195	117				
	31_4	*Aula Farmacologia*		175	105				
G		AULA MAGNA	1	380	228				**157.260,00 €**
	15_3	*Aula De Benedictis*		380	228				
		TOTALE	15	1828					**5.149.241,81 €**

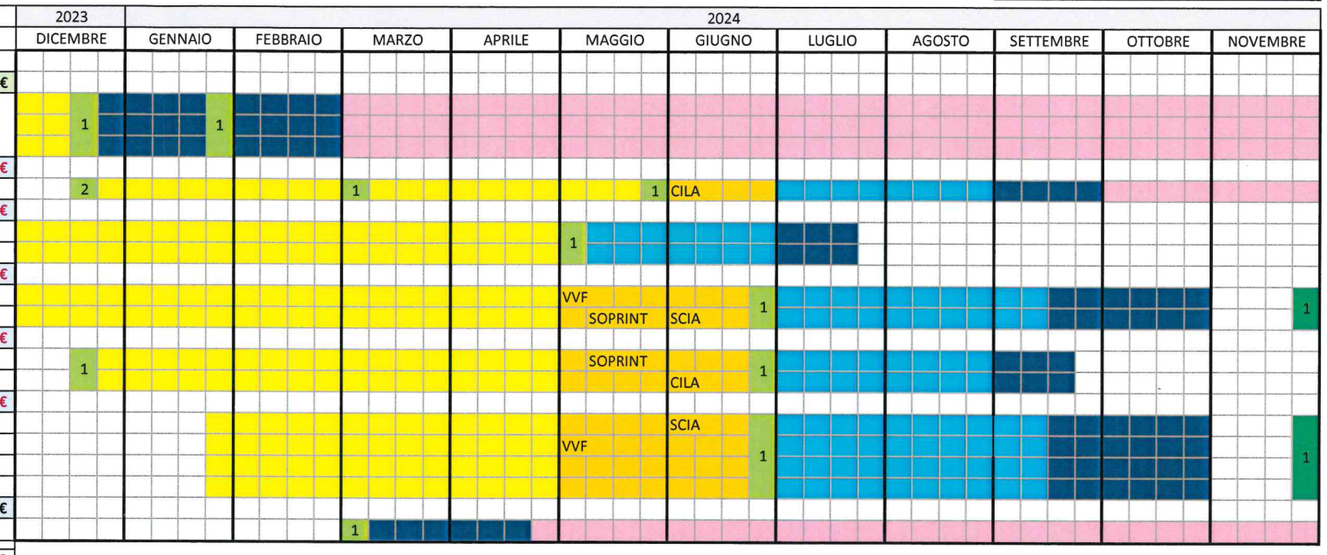

																								Interruzione Lezioni																							
Aule INDISPONIBILI per lavori (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	4	4
Aule DISPONIBILI a seguito lavori (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
Aule SOSTITUTIVE (A-B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**

2 aule da 200 p

LEGENDA

CILA	Autorizzazione comunale
SCIA	Autorizzazione comunale 30 gg prima inizio dei lavori
VVF	Parere dei Vigili del Fuoco
SOPRINT	Parere della Soprintendenza
	Progetto
	Autorizzazioni
	Ordine Lavori allestimento aule
	Ordine Lavori di adeguamento antincendio parti esterne
	Esecuzione Lavori
	Forniture
	Aule Disponibili per l'economia delle aule durante i lavori
	Interventi completati
	Interventi in corso
nn.nnn,00	Importi consuntivi
nn.nnn,00	Importi preventivi

Tmax = 0,6 x Np
