Accordo quadro di 3 anni per la riqualificazione e ammodernamento di aule e spazi didattici comprensivo di fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e apparati audio-video del Policlinico di Bari.

AGGIORNAMENTO 24/06/2024

DATA AVVIO APPALTO 07/12/2023

Ordini	Codice	AULE	N	Posti	Giorni	Arredi	Attrezz.	Lavori	TOT.
						650,00 €	40.000,00 €	1.000,00 €	
A		CLINICHE ODONTOIATRICHE	3	198	118,8				**269.064,81 €**
	21_1	*Aula A*		62	37,2				
	21_2	*Aula B*		86	51,6				
	21_3	*Aula C*		50	30				
B		CHIRURGIA	1	240	144	156.000,00 €	128.830,00 €	500.000,00 €	**784.830,00 €**
	20	*Aula De Blasi*		240	144	105.000,00 €		62.391,80 €	
C		RADIOLOGIA	2	125	75	59.648,00 €	48.202,00 €	101.487,00 €	**209.337,00 €**
	15_4	*Aula Radiologia*		100	60				
	15_4	*Aula*		25	15				
D		CLINICHE MEDICHE	2	400	240	380.000,00 €	217.000,00 €	642.000,00 €	**1.239.000,00 €**
	12_1	*Aula inferiore*		200	120				
	12_2	*Aula superiore*		200	120				
E		PEDIATRIA	2	130	78	114.500,00 €	40.000,00 €	215.000,00 €	**369.500,00 €**
	7_1	*Aula Vecchio*		100	60			8.944,00 €	
	7_2	*Aula B*		30	18				
F		ISTITUTI BIOLOGICI	4	735	441	477.750,00 €	80.000,00 €	1.562.500,00 €	**2.120.250,00 €**
	31_1	*Aula Mitolo*		165	99				
	31_2	*Aula Sangiorgi*		200	120				
	31_3	*Aula Solarino*		195	117				
	31_4	*Aula Farmacologia*		175	105				
G		AULA MAGNA	1	380	228				**157.260,00 €**
	15_3	*Aula De Benedictis*		380	228				
		TOTALE	15	1828					**5.149.241,81 €**

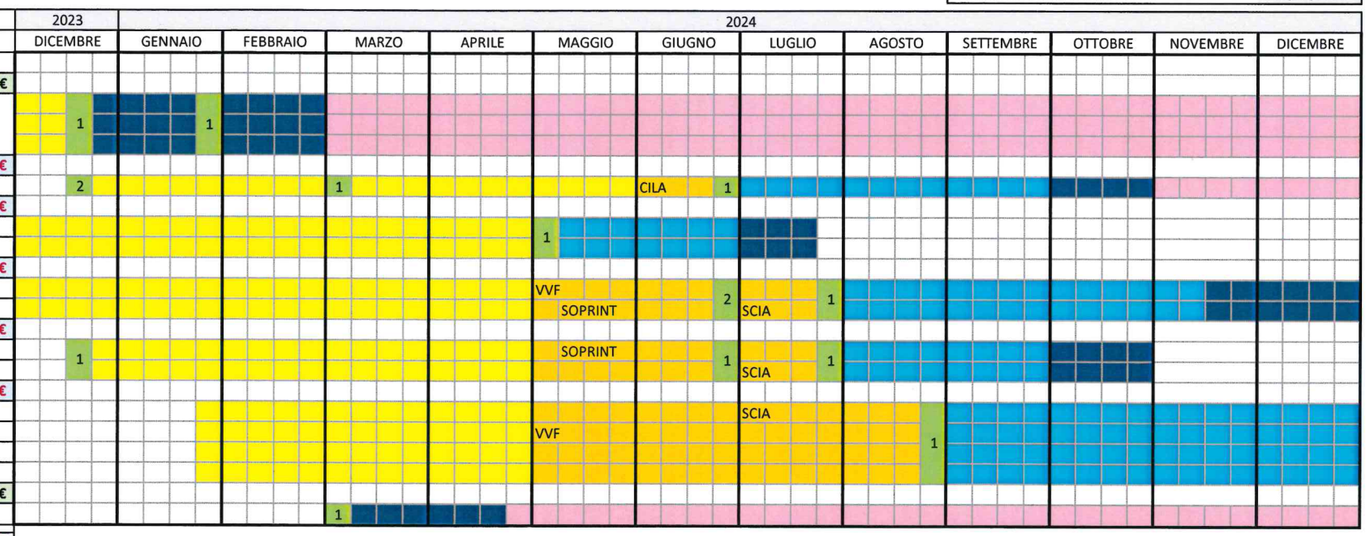

	Ordini	Codice	AULE	2023 DICEMBRE	2024 GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
	A		CLINICHE ODONTOIATRICHE													
		21_1	*Aula A*													
		21_2	*Aula B*	1		1										
		21_3	*Aula C*													
	B		CHIRURGIA													
		20	*Aula De Blasi*	2			1			CILA 1						
	C		RADIOLOGIA													
		15_4	*Aula Radiologia*						1							
		15_4	*Aula*													
	D		CLINICHE MEDICHE													
		12_1	*Aula inferiore*						VVF		2					
		12_2	*Aula superiore*						SOPRINT		SCIA 1					
	E		PEDIATRIA													
		7_1	*Aula Vecchio*	1					SOPRINT		1					
		7_2	*Aula B*								SCIA 1					
	F		ISTITUTI BIOLOGICI													
		31_1	*Aula Mitolo*								SCIA					
		31_2	*Aula Sangiorgi*						VVF				1			
		31_3	*Aula Solarino*													
		31_4	*Aula Farmacologia*													
	G		AULA MAGNA													
		15_3	*Aula De Benedictis*				1									

Aule INDISPONIBILI per lavori (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7
Aule DISPONIBILI a seguito lavori (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Aule SOSTITUTIVE (A-B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**

																									Interruzione Lezioni																	
Aule INDISPONIBILI per lavori (A)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Aule DISPONIBILI a seguito lavori (B)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Aule SOSTITUTIVE (A-B)	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

LEGENDA

CILA	Autorizzazione comunale
SCIA	Autorizzazione comunale 30 gg prima inizio dei lavori
VVF	Parere dei Vigili del Fuoco
SOPRINT	Parere della Soprintendenza
	Progetto
	Autorizzazioni
	Ordine Lavori allestimento aule
	Ordine Lavori di adeguamento antincendio parti esterne
	Esecuzione Lavori
	Forniture
	Aule Disponibili per l'economia delle aule durante i lavori
	Interventi completati
	Interventi in corso
nn.nnn,00	Importi consuntivi
nn.nnn,00	Importi preventivi

Tmax = 0,6 x Np
